



PROGRAMA ALIADO DIGITAL GHT

MVP del sistema “El Tejido de la red” y bolsa de
Requerimientos para la evolución digital continua
de GHT

CONTEXTO Y OBJETIVO

Contexto (El Tejido de la red)

El conocimiento de la red vive en la cabeza de sus líderes:

- El Tejido lo convierte en memoria institucional atribuida, evaluada y consultable.

El MVP entregará el flujo completo:

- Captura conversacional
 - El sistema conversa con los participantes y captura ideas y aprendizajes.
 - Retroalimentación breve y máximo una repregunta por respuesta.
- Evaluación con LLM
 - Usa la rúbrica de GHT: criterios y pesos sin tocar código.
 - Calificación y explicación guardadas con trazabilidad completa.
 - Prompts ajustables con aprobación de GHT.
- Memoria y consulta
 - Cada aporte se compila en Markdown con autoría y atribución.
 - Consulta de respuestas, calificaciones y Markdown generado.

Objetivo del programa Aliado Digital GHT

Un solo programa de USD 20.000 que permita:

- Primera versión del MVP de El Tejido: 22 de junio (USD 9.500).
 - Bolsa para nuevos requerimientos: USD 10.500 (≈86 horas).
 - La bolsa se consume solo con requerimientos aprobados y entregados.
- Un Aliado senior que ya conoce el ecosistema GHT.

VALOR DIFERENCIAL

❖ Visión integral con seniority real

Profesionales con más de 12 años de experiencia entienden cada requerimiento desde negocio, operación y tecnología: quien diseña es quien ejecuta.

❖ Soluciones sostenibles, no parches temporales

Cada solución ordena y fortalece el proceso, priorizando:

- Reducción de riesgo
- Escalabilidad
- Facilidad de evolución

❖ Conocimiento del ecosistema GHT

Ya trabajamos dentro de la red: arrancamos sin curva de aprendizaje.

❖ Aliados, no proveedores


Trabajamos de la mano como un verdadero Aliado: priorizamos juntos, construimos propuestas defendibles desde lo operativo y aprobables desde lo comercial.



SPRINT MVP EL TEJIDO

Kickoff 12 jun	Aprobación del programa, entendimiento inicial del sistema "El tejido de la red", alistamiento de insumos y arranque de arquitectura.
Avance inicial 17 jun	Primera aproximación navegable: núcleo conversacional y evaluación LLM con la rúbrica de GHT.
Memoria 18-19 jun	Generación Markdown con autoría y trazabilidad, y consulta de resultados.
Entrega 22 jun	Prueba con usuarios reales, ajustes y primera versión del MVP en operación.
Canal WhatsApp	GTA parametriza sobre la plataforma Meta de GHT al recibir la línea y el medio de pago; parametrización en 1 día, incluido.
Canal web	Si la línea no está lista, la entrega del 22 sale por una página web simple con el flujo completo.
Reporte diario	GTA presenta un avance corto cada día del sprint para decisión inmediata.

ARQUITECTURA DEL MVP

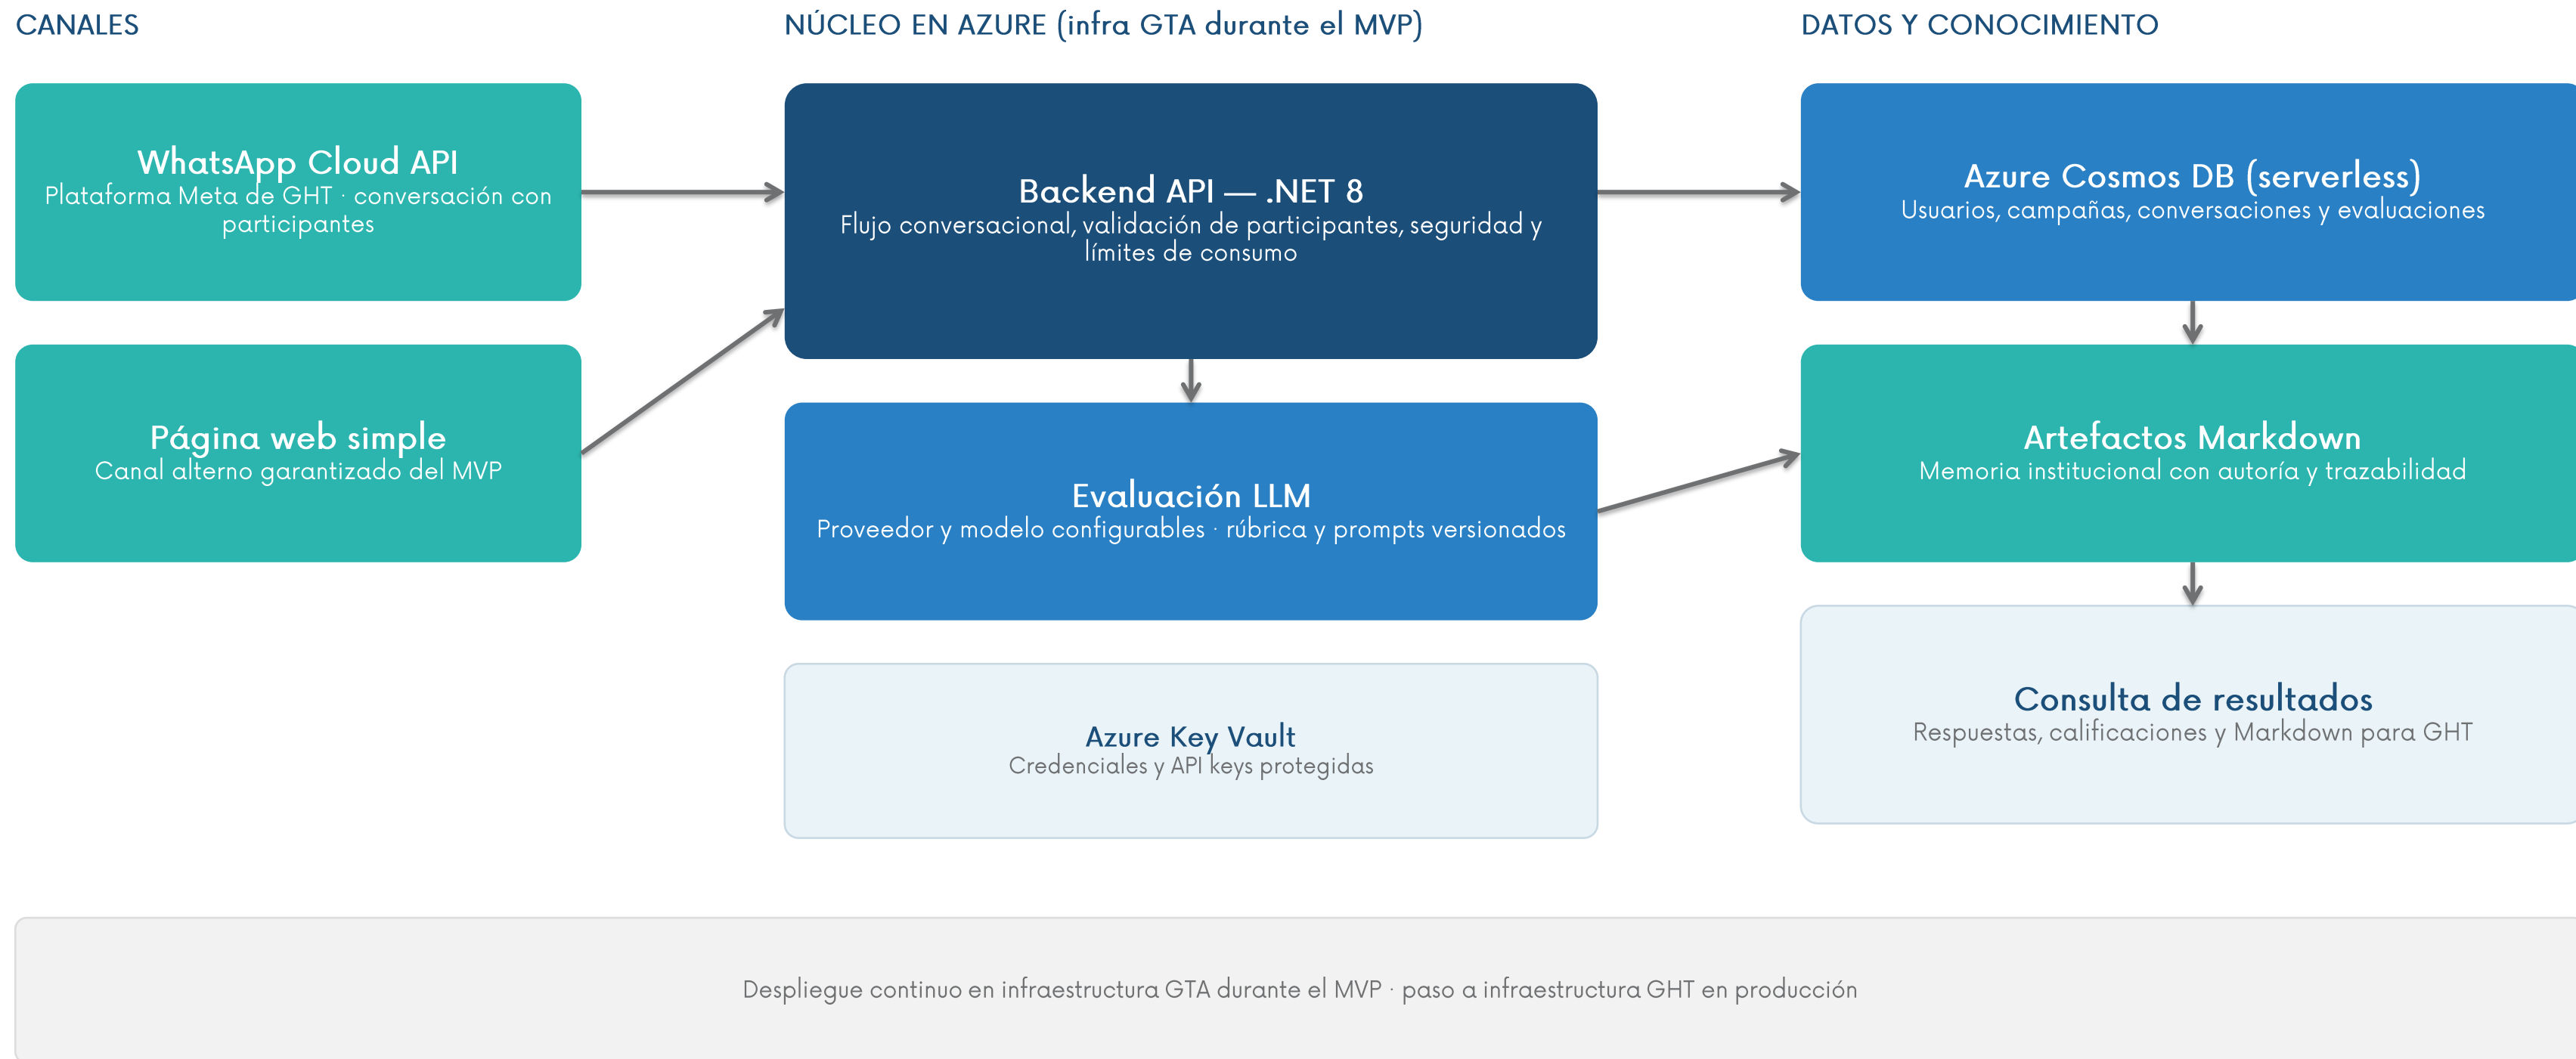


BOLSA DE REQUERIMIENTOS

Ejecución de requerimientos

Los nuevos trabajos digitales de GHT —evolución de El Tejido, integraciones u otras iniciativas— se ejecutan mediante el mismo proceso de requerimientos aprobados.

Proceso de ejecución

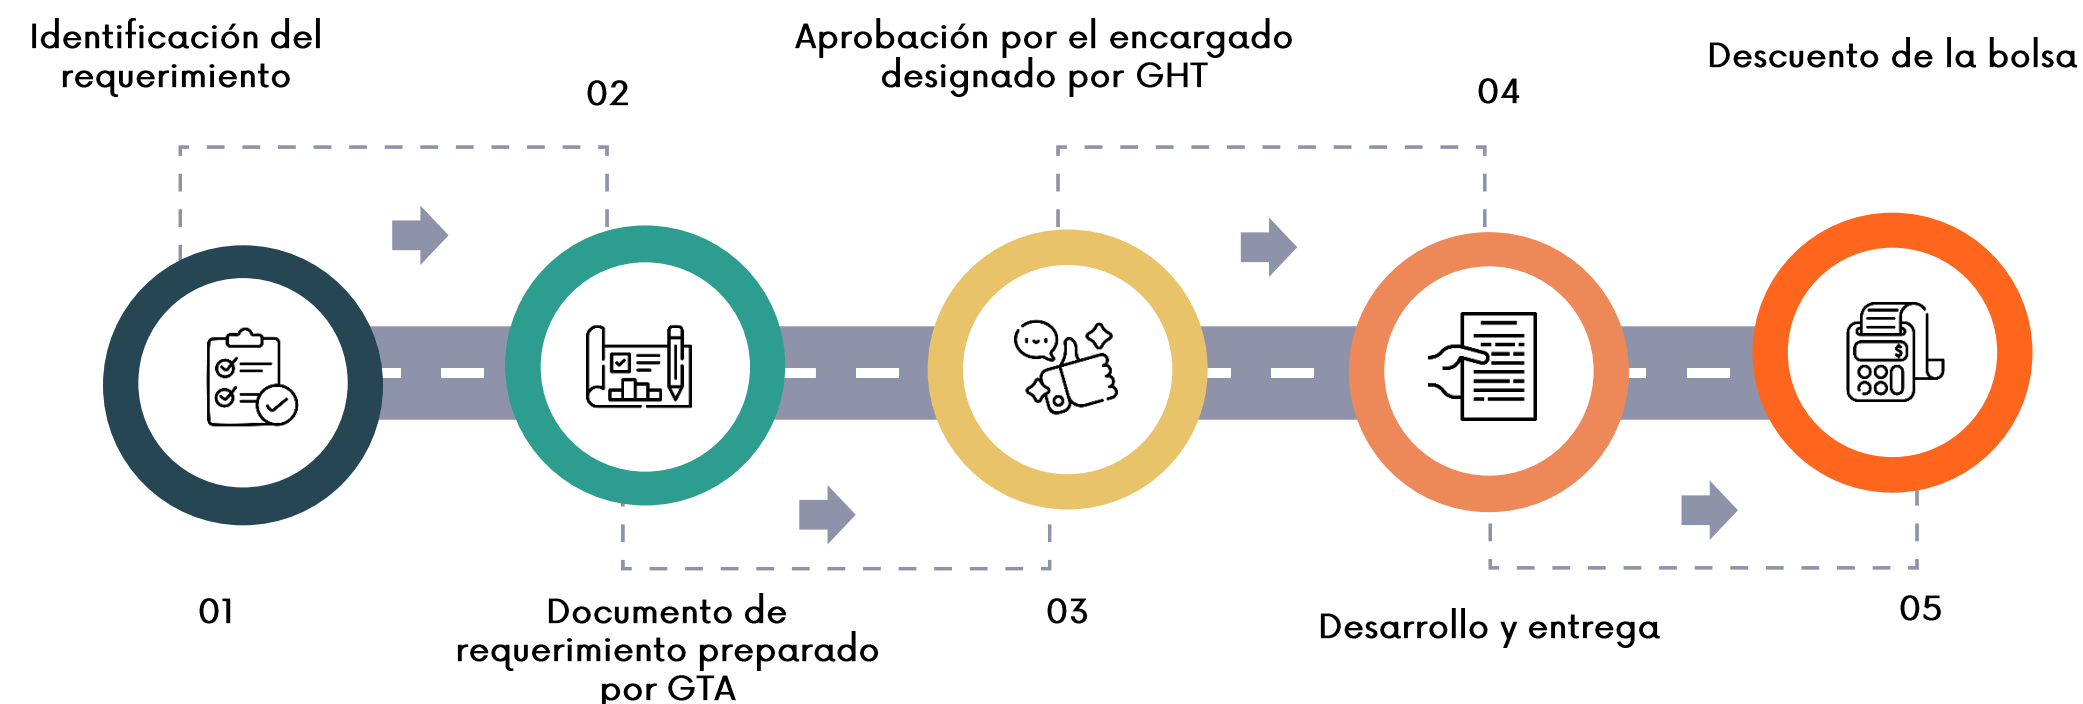

Capacidad de la bolsa

La bolsa es de USD 10.500, equivalente a ≈ 86 horas del equipo a la tarifa de referencia (USD 19.500 / 160 horas al mes). Solo se descuenta lo aprobado y entregado. Vigencia: 31 de diciembre de 2026.

INVERSIÓN Y CONDICIONES

Inversión total del programa: USD 20.000

El programa combina un precio fijo para el MVP de El Tejido y una bolsa para nuevos requerimientos. El MVP tiene alcance cerrado con entrega en junio 2026. La bolsa se consume únicamente contra requerimientos aprobados y entregados, con saldo visible para GHT.

Resumen:

Componente

MVP El Tejido (precio fijo)

Bolsa de requerimientos (≈86 h)

Total del programa

Valor

USD 9.500

USD 10.500

USD 20.000

Condiciones

Durante el MVP la solución opera en infraestructura de GTA; los consumos (Azure, WhatsApp API, LLM) se facturan a GHT con los soportes correspondientes, sin margen.

- ❖ Para producción, la solución se despliega en infraestructura de GHT, que asume su operación y costo directo.
- ❖ Si un requerimiento excede el saldo de la bolsa, se cotiza y aprueba aparte antes de iniciar.
- ❖ Las cifras en USD no incluyen impuestos aplicables.

COMPROMISOS Y PRÓXIMOS PASOS

Próximos pasos:

1. Aprobación del programa — kickoff el viernes 12 de junio.
2. Primera aproximación el 17 de junio, entrega del MVP el 22 y priorización del primer requerimiento de la bolsa.

Compromisos de las partes

GTA:

- Equipo senior a disposición para atender los requerimientos de GHT.
- Parametrización de WhatsApp sobre la plataforma Meta de GHT.

GHT

- Línea celular y tarjeta de crédito en la plataforma Meta.
- Lista de usuarios de prueba y aprobación de prompts.
- Validación oportuna de entregables.
- Encargado designado para aprobar requerimientos de la bolsa.

Operación y soporte

Tras la estabilización del MVP, las funcionalidades pasan a modo soporte bajo la bolsa de requerimientos.

La infraestructura productiva es responsabilidad de GHT.





¡GRACIAS!
