



PROGRAMA ALIADO DIGITAL GHT

MVP sistema El Tejido de Red

CONTEXTO Y OBJETIVO

Contexto (El Tejido)

Base lista para arrancar:

- la rúbrica de evaluación y las credenciales de la plataforma Meta ya fueron entregadas por GHT.

El MVP entregará el flujo completo:

- Captura conversacional
 - El sistema conversa con los participantes y captura ideas y aprendizajes.
 - Retroalimentación breve y máximo una repregunta por respuesta.
- Evaluación con LLM
 - Usa la rúbrica entregada por GHT: criterios y pesos sin tocar código.
 - Calificación y explicación guardadas con trazabilidad completa.
 - Prompts ajustables con aprobación de GHT.
- Memoria y consulta
 - Cada aporte se compila en Markdown con autoría y atribución.
 - Consulta de respuestas, calificaciones y Markdown generado.

Objetivo del programa

Un solo programa de USD 10.000 que permita:

- primera versión del MVP de El Tejido: 22 de junio.
- Requerimientos adicionales bajo bolsa de horas por aprobar.
- un Aliado senior que ya conoce el ecosistema GHT

VALOR DIFERENCIAL

❖ Visión integral con seniority real

Profesionales con más de 12 años de experiencia entienden cada requerimiento desde negocio, operación y tecnología: quien diseña es quien ejecuta.

❖ Soluciones sostenibles, no parches temporales

Cada solución ordena y fortalece el proceso, priorizando:

- Reducción de riesgo
- Escalabilidad
- Facilidad de evolución

❖ Conocimiento del ecosistema GHT

Ya trabajamos dentro de la red: arrancamos sin curva de aprendizaje y con la urgencia de mostrar resultados desde la primera semana.

❖ Aliados, no proveedores

Trabajamos de la mano como verdaderos aliados: priorizamos juntos, construimos propuestas defendibles desde lo operativo y aprobables desde lo comercial.



SPRINT MVP EL TEJIDO

Kickoff 13 jun

Aprobación del programa, arranque de arquitectura.

Avance web 17 jun

Primera aproximación navegable: núcleo conversacional y evaluación LLM con la rúbrica de GHT, por web.

Memoria 18–19 jun

Generación Markdown con autoría y trazabilidad, y consulta de resultados.

Entrega 22 jun

Prueba con usuarios reales, ajustes y primera versión del MVP.

Canal WhatsApp

GTA parametriza sobre la plataforma Meta de GHT al recibir la línea y la tarjeta; activación en 2 días hábiles, sin costo.

Canal web

Si la línea no está lista, la entrega del 22 sale por una página web simple con el flujo completo.

Reporte diario


GTA presenta un avance corto cada día del sprint para decisión inmediata.

BOLSA DE REQUERIMIENTOS

Ejecución de requerimientos

Los nuevos trabajos digitales de GHT —evolución de El Tejido, integraciones u otras iniciativas— se ejecutan mediante el mismo proceso de requerimientos aprobados.

Proceso de ejecución

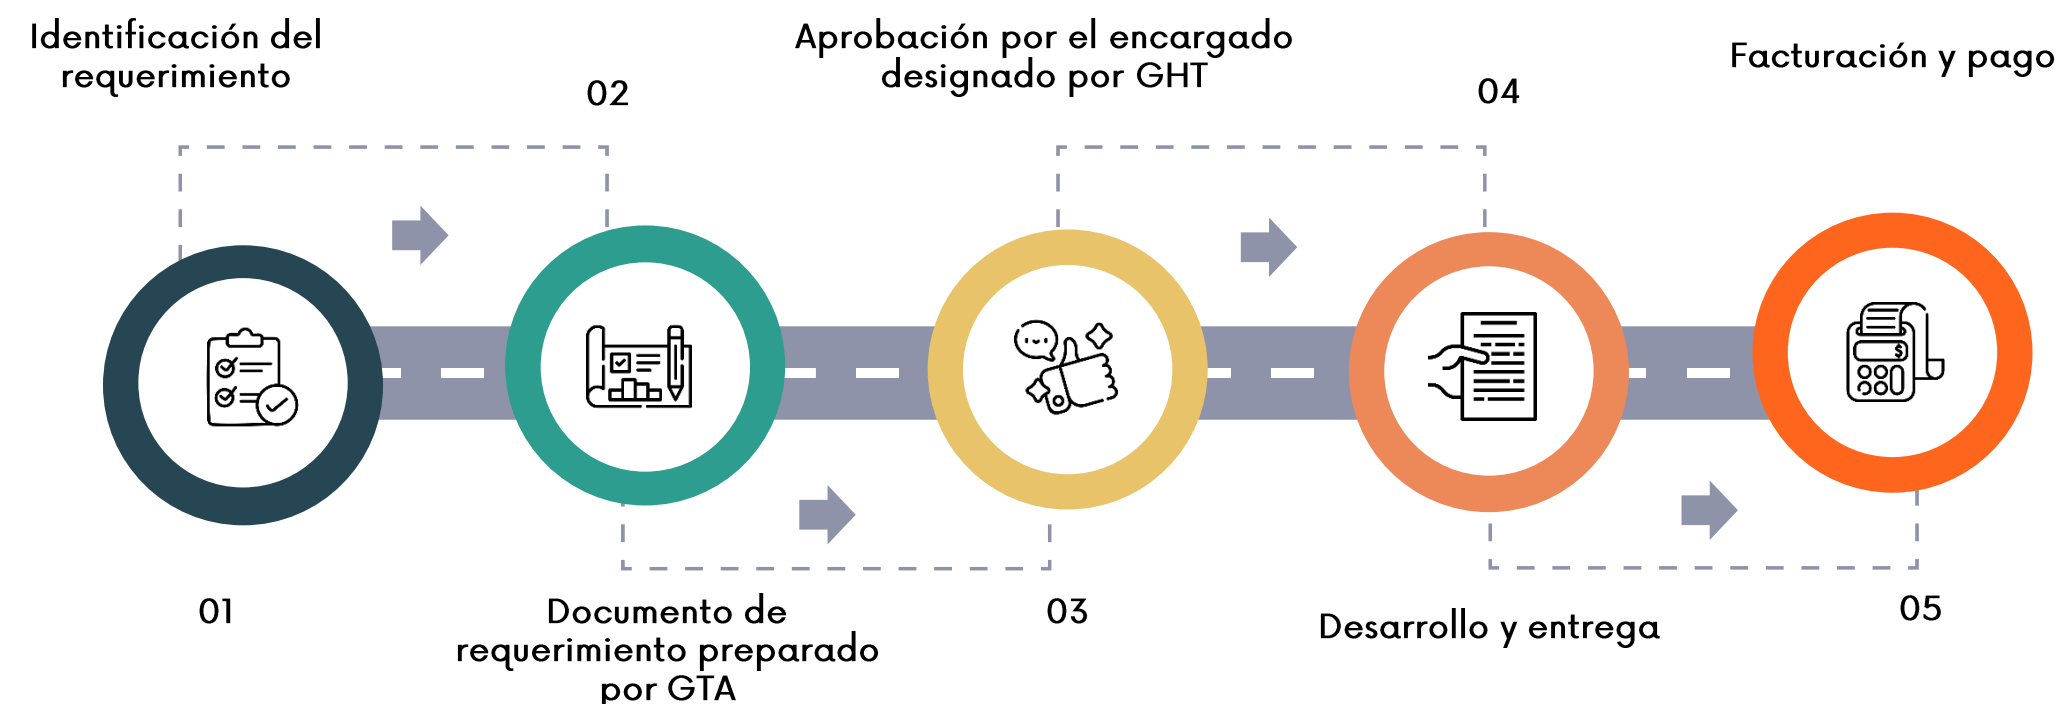

Bolsa de horas para requerimientos futuros

Para requerimientos adicionales se ofrece una bolsa de USD 10.000, equivalente a ≈ 80 horas del equipo a la tarifa de referencia. Nada se desarrolla ni factura sin aprobación previa y solo se descuenta lo entregado. Vigencia: 31 de diciembre de 2026.

INVERSIÓN Y CONDICIONES

Inversión total del MVP: USD 10.000 - Precio fijo por el MVP del sistema.

Condiciones

Durante el MVP la solución opera en infraestructura de GTA; los consumos (Azure, WhatsApp API, LLM) se facturan a GHT con los soportes correspondientes.

Para producción, la solución se despliega en infraestructura de GHT, que asume su operación y costo directo.

Cualquier requerimiento adicional al alcance del MVP se cotiza y aprueba por separado antes de iniciar.

Las cifras en USD no incluyen impuestos aplicables.



COMPROMISOS Y PRÓXIMOS PASOS

Próximos pasos:

1. Aprobación del programa — kickoff el viernes 13 de junio.
2. Primera aproximación el 17 de junio, entrega del MVP el 22 y priorización del primer requerimiento de la bolsa.

Compromisos de las partes

GTA:

- Equipo senior con más de 12 años de experiencia
- Parametrización de WhatsApp sobre la plataforma Meta de GHT
- Canal web garantizado y reporte diario del sprint

GHT

- Línea celular y tarjeta de crédito en la plataforma Meta
- Lista de ~5 usuarios de prueba y aprobación de prompts
- Validación oportuna de entregables (rúbrica y credenciales: ya entregadas)
- Pagos según condiciones acordadas

Operación y soporte

Tras la estabilización del MVP, las funcionalidades pasan a modo soporte bajo la bolsa de requerimientos (bolsa de requerimientos pendiente de aprobación).
La infraestructura productiva es responsabilidad de GHT.





¡GRACIAS!
